



# Proposition financière

Application web de gestion – Jardin de Cocagne

Entreprise : Software Architecture Evolutions <sub>1</sub>

# Plan



Page de garde



Présentation du  
projet et du  
contexte




Objectifs de la  
proposition  
financière



Répartition du  
travail (vue  
global)



Estimation des  
charges



Devis interne  
(coûts réels et  
marges)



Devis externe  
(proposition  
client)




Synthèse et  
conclusion

# Page de garde



Proposition financière –  
Application web Jardins  
de Cocagne



Groupe : ALGUL Sefer –  
GRANDGIRARD Louis



Entreprise : Software  
Architecture Evolutions



Date : 24 octobre 2025

# Présentation du projet et du contexte

Application web pour la gestion :

- Des adhérents,
- Des dépôts,
- Des tournées,
- Et des paniers

Développée avec PHP – Symfony, MySQL, Twig et Bootstrap

Client : Réseau des Jardins de Cocagne

Durée du projet : 200 heures

Livraison prévue pour le 20 janvier 2026

# Objectifs de la proposition financière



ESTIMER LE TEMPS ET LE  
COÛT DE CHAQUE RENDU



DISTINGUER LES CHARGES  
INTERNES ET LA  
PROPOSITION CLIENT




GARANTIR LA VIABILITÉ  
ÉCONOMIQUE DU PROJET  
POUR L'ENTREPRISE



FOURNIR UNE VISION CLAIRE  
ET JUSTIFIÉE AU CLIENT SUR  
L'INVESTISSEMENT GLOBAL

## Répartition du temps de travail

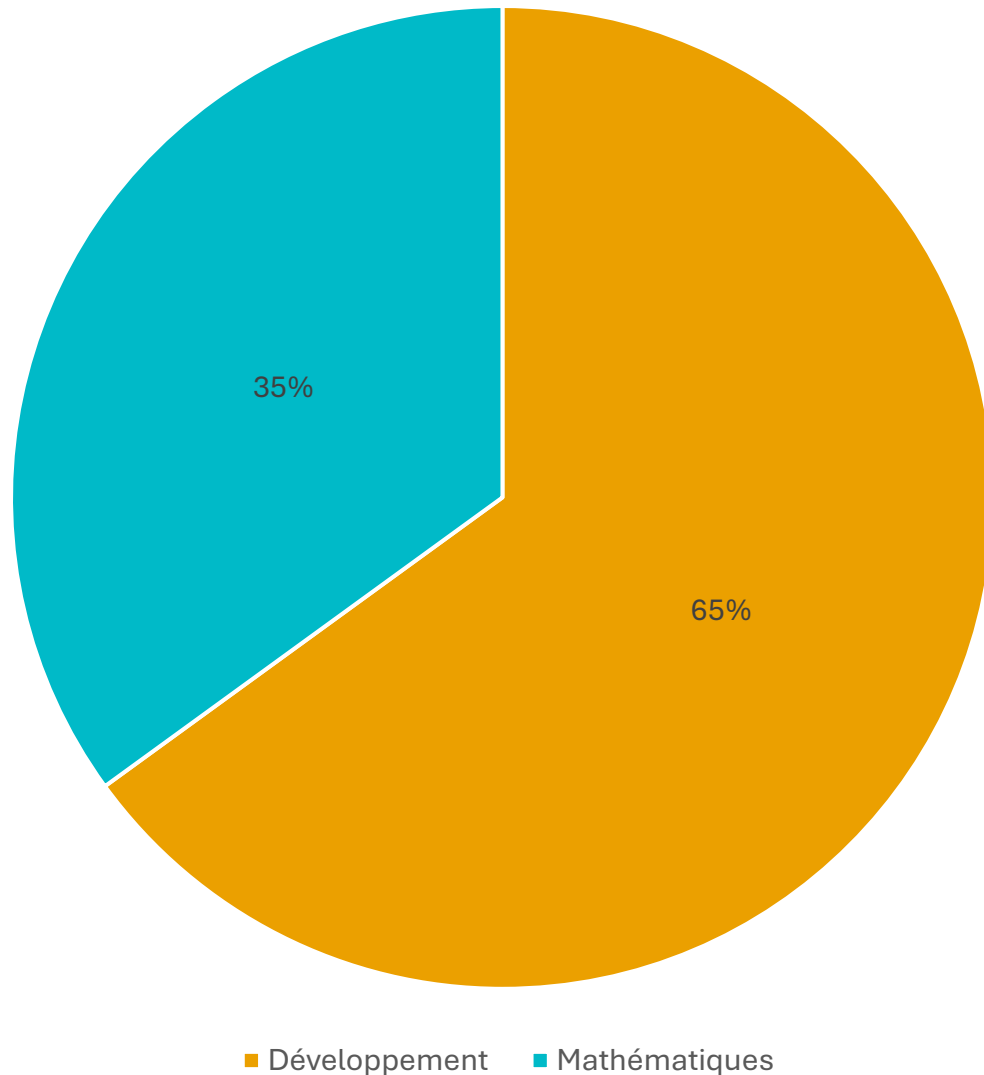

# Répartition du travail (vue global)

- Développement (130 heures) : analyse, conception, codage, test et documentation
- Mathématiques (70 heures) : modélisation, optimisation, statistiques

# Estimation des charges

Type de charge	Détail	Montant estimé
Main d'oeuvre	200 heures * 20€	4 000€
Charges patronales (50%)	Assurances, congés ...	2 000€
Licences / Hébergement	GitLab, docker, serveur test	200 €
Matériels et énergie	Postes, électricité, réseau	100 €
Coût total interne estimé		6 300€

# Devis interne

- Coût horaire interne : 20€ par heures
- Charges et frais fixes : +50%
- Marge bénéficiaire entreprise : +25% sur le coût complet
- Coût de revient total :  $200h * 20€ * 1,5 * 1,25 = 7500€$


Élément	Montant
Coût réel (brut + charges)	6 000€
Marge de l'entreprise	1 500€
Prix de vente HT	7 500€
TVA (20%)	1 500 €
Total TTC	9 000€



# Devis externe

N°	Rendu	Heures	Montant HT
1	Analyse comparative	10h	300 €
2	Cahier des charges fonctionnels	10h	300€
3	Cahier des charges techniques	10h	300€
4	Proposition financière	5h	150€
5	Kick-off meeting	3h	90€
6	Base de données	10h	300€
7	Environnement de développement	9h	270€
8	Web service	15h	450€


9	Programmation avancée	10h	300€
10	Programmation multimédia	10h	300€
11	Compléments mathématiques	16h	480€
12	Méthode d'optimisation	16h	480€
13	Modélisations mathématiques	16h	480€
14	Probabilité et statistiques	15h	450€
15	Back-office 1	15h	450€
16b	Back-office 2	15h	450€
17	Front-office	10h	300€
18	Tests / Profilages / Mesures	5h	150€
Total		200h	6 000€ HT



Total HT : 6 000€



TVA (20%) : 1 200€



Total TTC : 7 200€

---

# Synthèse et conclusion



Le projet Jardins de Cocagne est estimé à 200 heures de travail pour un coût total de 7 200€ TTC.



Le coût interne pour l'entreprise est de 6 000€, garantissant une marge raisonnable.



Cette estimation inclut toutes les étapes du développement : analyse, conception, codage, tests, documentation et optimisation.



La livraison est prévue pour le 20 janvier 2026
